

台儿庄区人民医院迁建项目  
优化设计专题会议

# 会议纪要



山东晨旭建设项目管理咨询有限公司  
台儿庄区人民医院迁建项目全过程工程咨询项目部  
2021年6月21日



会议主题：台儿庄人民医院迁建项目优化设计专题会议

主 持 人：臧增田

参加人员：

区人民医院：赵辉院长

项目建设指挥部：宋树文书记 李伟书记

区建筑工程质量监督站：杨立新站长

区建筑设计院：孟凡平院长

同圆设计集团公司：王希建院长 范超

山东晨旭全咨项目部：臧增田 雷玉志 王涛 孙晋成

中建八局第二建设有限公司项目部：王思顺

会议地点：项目部会议室

会议日期：2021 年 6 月 21 日 星期一 下午 14: 30 分

---

## 会 议 纪 要

一、全咨项目部对地下室外墙周边回填材料、原图纸设计情况、设计单位出具的设计变更情况以及全咨项目部对不同回填材料的技术性、经济性分析、比较等情况分别进行了介绍。参会人员均发表了意见和建议，经多角度综合分析、比较，明确全部采用 3:7 灰土回填不是最优做法。会议确定外墙周边 1 米范围内采用 2:8 灰土回填，1 米范围之外采用素土回填的做法。

二、项目主体结构施工进度较快，要求设计单位加快医疗专项设计进度，尽快出图以便总包单位进行管线综合 BIM 设计。要求内装及室外配套工程等剩余设计工作尽快完成。


三、要求设计单位安排设计代表参加每周全过程工程咨询例会，及时反馈需解决的设计问题。会议明确，与设计相关问题均以书面来往函件为准。

四、区人民医院与设计院就疾病感染楼项目是否变更进行沟通，确定按原图施工；


五、全咨项目部对设计图纸中前后矛盾、施工难度大、做法不合理等设计内容提出 36 条优化建议。设计单位高度重视全咨项目部提出的优化建议，表示将组织设计人员认真分析、研究，尽快完成优化设计工作并及时下发设计变更通知单。



山东晨旭建设项目管理咨询有限公司  
台儿庄区人民医院迁建项目全过程工程咨询项目部



附件：会议照片

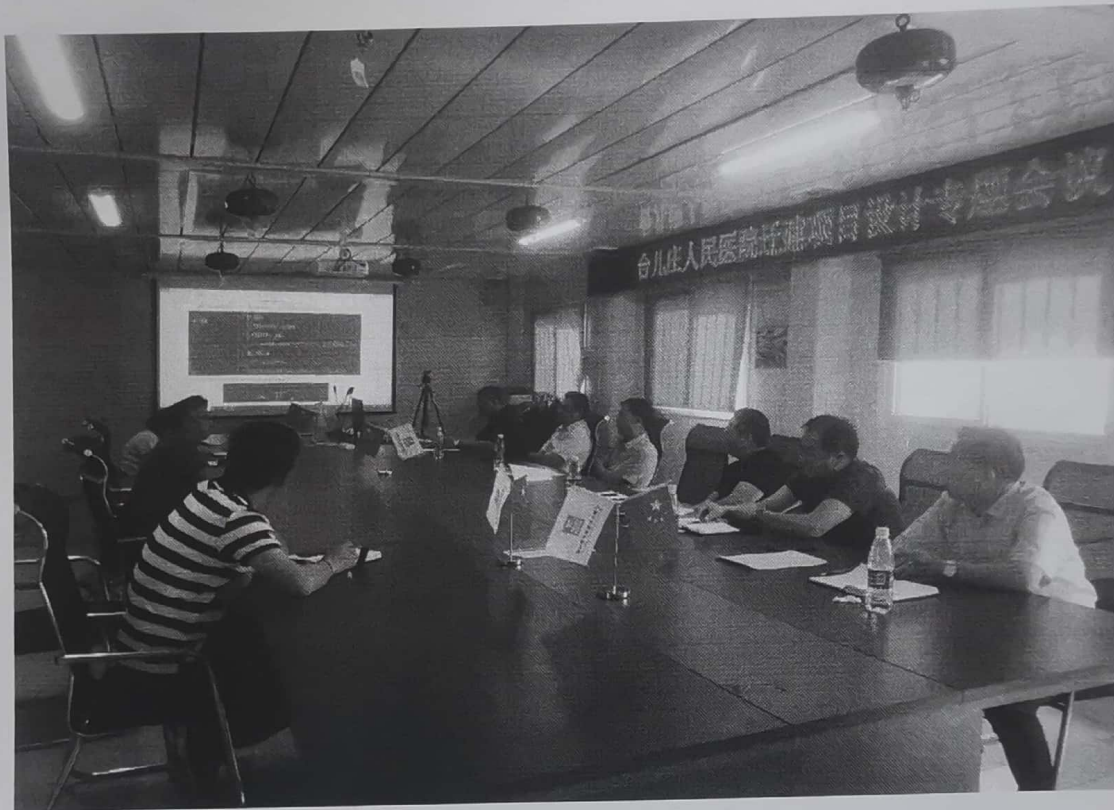



# 同圆设计股份集团有限公司 工程变更/答复通知

|      |                   |    |            |    |            |
|------|-------------------|----|------------|----|------------|
| 主送单位 | 枣庄市台儿庄区人民医院       | 专业 | 建筑         | 编号 | 10         |
| 工程名称 | 台儿庄区人民医院迁建项目医疗综合楼 | 工号 | 200831-001 | 日期 | 2021.06.17 |

根据现场情况，明确建筑设计说明中地下室回填做法如下：

1. 地下室侧墙外 1.00m 范围内回填材料为 2:8 灰土,1m 范围外为素土回填；
  2. 地下室侧墙保护层使用 100 厚加气混凝土砌块+50 厚挤塑聚苯板（B1）保温层；
- 以下无正文 —



|         |             |    |  |  |
|---------|-------------|----|--|--|
| 审核人     | 陈岚          | 会签 |  |  |
| 专业负责人   | 水红          |    |  |  |
| 设计人     | 水红          |    |  |  |
| 设计人联系电话 | 13706400855 |    |  |  |

